H29.10.26実施　日高村通学路安全対策連絡協議会結果

日高村内通学路の対策箇所一覧表（H28.7.26合同点検箇所）

■平成28年度の新規箇所

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	H29.10.26 実績報告	対策の結果
1-1	中村～江尻（村道）	・カーブミラーが見づらい ・歩道にガードレールが無いので危険 ・道路沿い民家の植栽が見通しを悪くしている	・道幅が狭くなる地点へのカーブミラーの設置を行う ・見通しが確保できる程度に伐採してもらえるよう住民にはたらきかけていく	日高村建設課	・カーブミラーを追加し対策済みである。 ・当課としては危険性が薄いためガードレールの設置は考えていない。 ・住民に働きかけて伐採等をしてもらい見通しを確保した。	済 － 済
1-2	六分坂付近（R33）	・国道の歩道が狭い	・白線に点線（減速を促す表示）をつける	土佐国道事務所	・減速路面標示を実施済。	済
1-3	暮月～西田（村道）	・街頭が無く暗い	・要望が挙げられた以降に道路脇の枝や雑草が刈られ、以前よりは明るさが確保されるようになっている ・長山田～民家の間に街灯が３つ設置されているが、要望時には２つしか確認できていなかったのでは（尚、正常に点灯しているか確認を行う）	日高村総務課	・枝及び雑草等を伐採して明るさを確保した。 ・現在街灯を5基設置しており、現在も正常に5基が点灯している。	済 済
1-4	折月付近（R33）	・国道の歩道が狭い	・点線（減速を促す表示）が薄くなっている箇所の塗り直し→要望を挙げることが必要	土佐国道事務所	・減速路面標示を実施済。	済
1-5	岩目地交差点付近 （R33）	・県道297号線正岡石油前の道路が狭く、ともなって歩道も狭い ・国道の歩道が狭い	・要望を挙げているが順番待ちの状態 ・歩道及び交差点改良を要望。	中央西土木事務所 土佐国道事務所	・岩目地交差点付近の整備の必要性は認識しており、今後、国道と時期を合わせた整備を検討していく。 ・外の交通対策事業の進捗状況を踏まえ事業化を要望。	継続 継続
1-6	妹背付近（R33）	・歩道に段差があって危険な箇所がある ・道路沿い民家の塀が見通しを悪くしている箇所がある ・国道の歩道が狭い	・段差については改善を行う ・歩道を要望。 今後調整をとりながら進めていく	土佐国道事務所	・段差については舗装などして改善した。 ・外の交通対策事業の進捗状況を踏まえ事業化を要望。 ・外の交通対策事業の進捗状況を踏まえ事業化を要望。	済 継続 継続
1-7	日下駅前付近（R33）	・民家と歩道の間に段差が生じている箇所があり危険である ・信号が無く、見通しが悪い ・国道の歩道が狭い	・段差についてはカラー塗装やシール等製品的に相応しいものを探して早急に対応する ・歩道要望。	土佐国道事務所	・反射物を設置し対策済。 ・外の交通対策事業の進捗状況を踏まえ事業化を要望。	済 継続

■平成28年度の継続対策箇所

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	H29.10.26 実績報告	対策の結果
2-1	日下橋～社会福祉センター（県道291号）	・歩道がほとんどない ・交通量が多い ・大型車両の通行が多い	・歩道の設置・拡幅を行う	中央西土木事務所	・一部改善した。 H29.4.7 今市橋側道橋(幅2mの歩道橋)が開通 【来年度（H30年）に、踏切から国道までの工事を実施】	一部継続
2-2	大橋東付近（R33）（村道）	・見通しが悪い	・国道の歩道の設置・拡幅を行う ・村道の路側帯の設置・拡幅を行う	土佐国道事務所 日高村建設課	・【継続箇所】 ・村道を拡幅し改善した。	継続 済

■平成29年度の新規箇所

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	H29.10.26 提案	対策の結果
3-1	JA選果場 農道（村道）	・中学校から村道（農道）への出口（ハウスとハウスの間）の西側に自動販売機が設置されているため、西側からの村道が死角になり危険がある。	・私有地のため所有者に協力を求めてはどうか。 ・交通安全推進会議等と協力して所有者に協力を求めてどうか	日高村建設課	本日新規に通学路対策箇所として提案する	新規 ・建設課と産業環境課で対応予定

■通学路対策位置図(日高村)(H29 年度版)

岩目地地区(1-5)

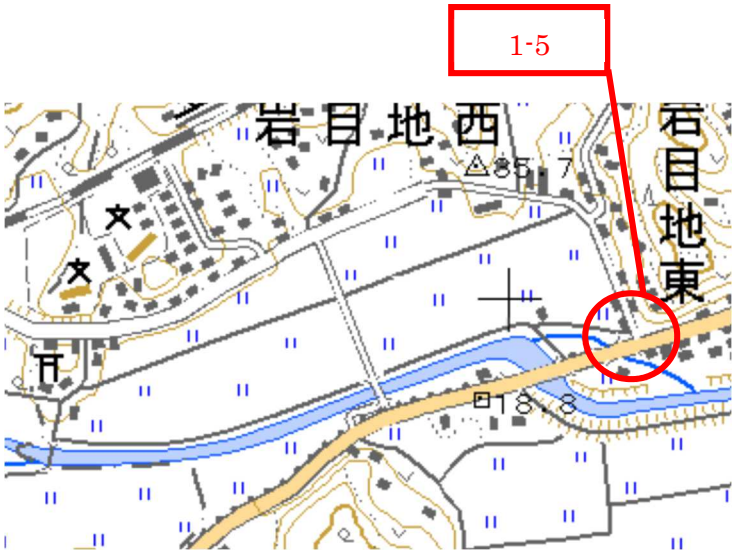

本郷・下分・沖名地区(1-1～1-4、1-6～1-7、2-1～2-2)

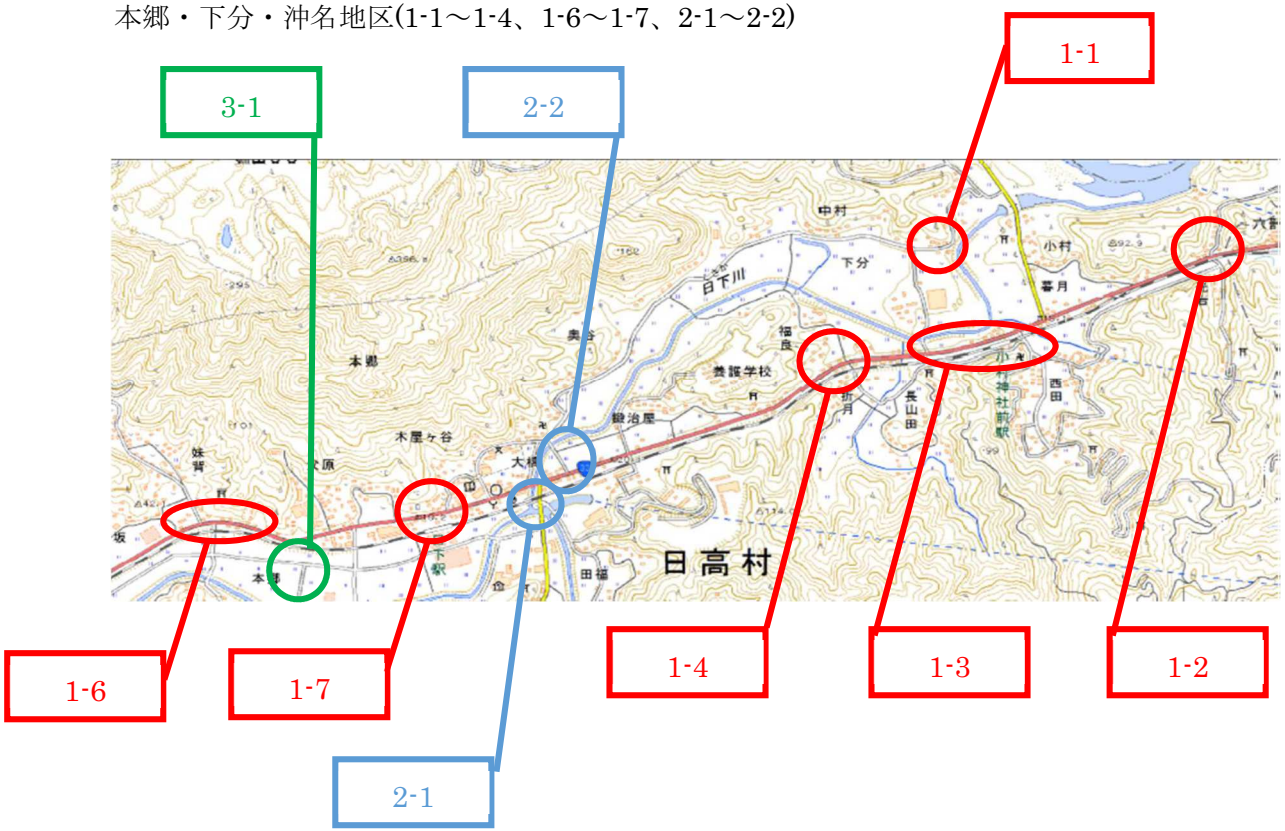

□(1-1～1-7)は平成 28 年度の新規箇所

□(2-1～2-2)は平成 28 年度の対策継続箇所

□(3-1)は平成 29 年度の新規箇所

※この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。
